




UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA TECNICA

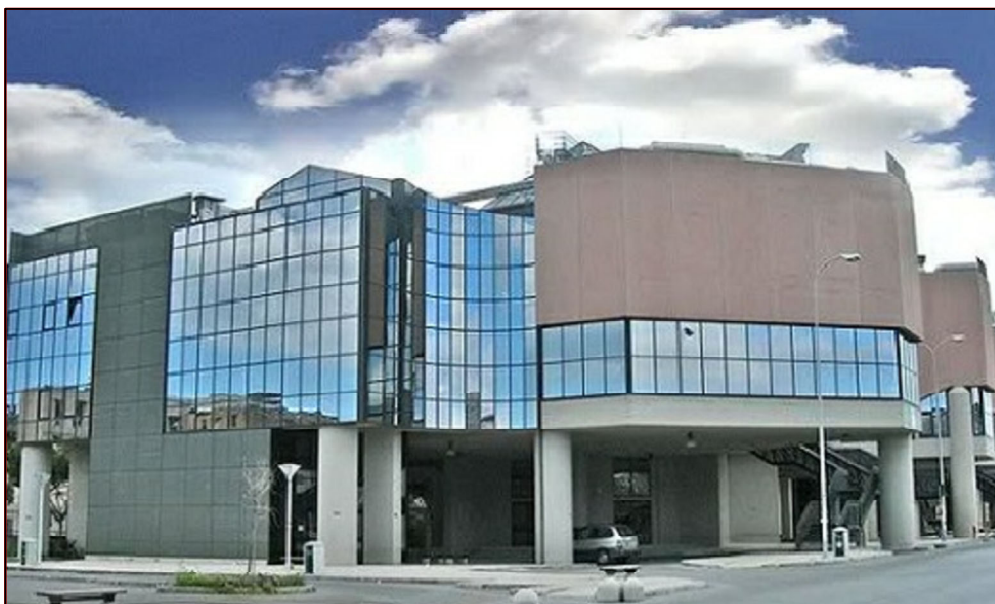

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
L'AMMODERNAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DEGLI
IMPIANTI AUDIO-VIDEO MULTIMEDIALI A SERVIZIO
DELLA DIDATTICA PRESSO LE AULE DEL COMPLESSO
DIDATTICO - EDIFICIO 19 A PARCO D'ORLEANS

PROGETTAZIONE
U.O. ANALISI, MONITORAGGIO E GESTIONE
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI,
VIDEOSORVEGLIANZA

ing. Giovanni Signorino

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

ing. Giovanni Signorino

IL DIRIGENTE
DELL'AREA TECNICA

ing. Antonio Sorce

TAV. N.

E07

TITOLO:

CRONOPROGRAMMA
DELLE LAVORAZIONI

DATA: GIUGNO 2020

GIORNI NON LAVORATIVI	
Per andamento stagionale normale o per ferie considerati nella valutazione del tempo contrattuale "Tc"	

N	GENNAIO 0,70	FEBBRAIO 0,80	MARZO 0,80	APRILE 0,90
N	MAGGIO 0,90	GIUGNO 0,90	LUGLIO 0,90	AGOSTO 0,60
N	SETTEMBRE 0,90	OTTOBRE 0,85	NOVEMBRE 0,70	DICEMBRE 0,60

ANNOTAZIONI	
<p>In relazione all'entità ed al tipo di lavoro, il programma dei lavori è stato predisposto secondo la "produzione ottimale mensile P", tenuto conto dei coefficienti di riduzione mensile "R" soprariportati e nell'ipotesi che i lavori, di durata 90 giorni, possano essere consegnati nel mese di gennaio 2021. La determinazione della produzione ottimale mensile "P" viene riportata nella Tabella dell'allegato 1 - al Programma dei lavori; dall'esame della predetta Tabella risulta :</p> <p>"P" = € 342.131,87/2,3 = €/mese 148.752,99</p>	

N.	MESI		Produzione ottimale mensile "P"	Coeff. di riduzione mensile "R"	IMPORTI PARZIALI "P" x R (in euro)	IMPORTI PROGR. (in euro)
1	Consegna	gen-21	148.752,99	0,70	104.127,09	104.127,09
2		feb-21	148.752,99	0,80	119.002,39	223.129,49
3		mar-21	148.752,99	0,80	119.002,39	342.131,87
			TOTALE "R"	2,30		

FASI	CATEGORIE DI OPERE	mesi di lavorazione			IMPORTO FASE
		1	2	3	
1	Corpi B e C	Approntamento cantiere			
	Corpo A	Approntamento cantiere			
	IMPORTO DEI LAVORI (Euro)	IMPORTO COMPLESSIVO (Euro) € 342.131,87			
	IMPORTO PROGR. DEI LAVORI (Euro)	AL QUADRO 2			

[illegible]
