




# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

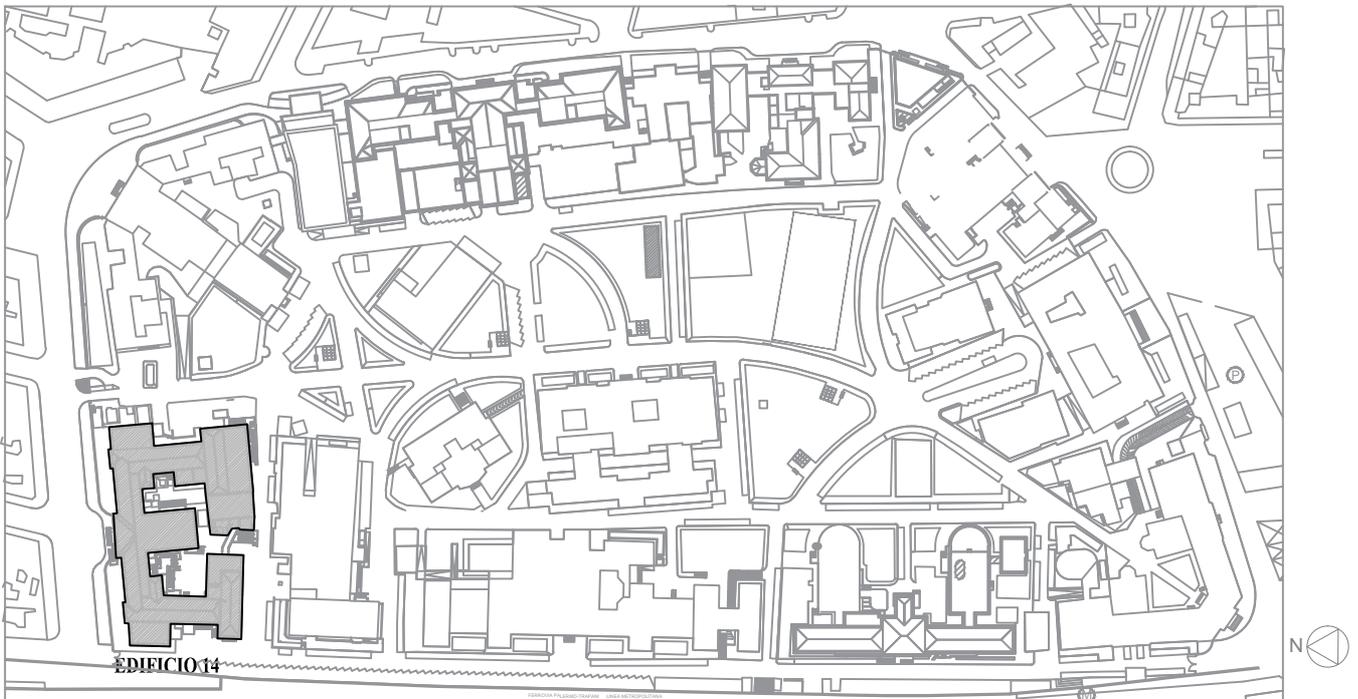

## LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL'AULA "MANESCHI", SITA NEL PLESSO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA

### PROGETTAZIONE:

Area Tecnica

Progettazione architettonica preliminare  
ed esecutiva:

Arch. Rosario Musso

Progettazione impianti:

Ing. Dario La Torre

Collaboratore:

P.I. Remo Corsetti

Coordinatore della sicurezza in fase di  
progettazione:

Arch. Rosario Musso

Responsabile Unico del Procedimento:

Arch. Rosario Musso

Collaboratore esterno alla progettazione:

Ing. Andrea Cerasola

PROGETTO ESECUTIVO

P.S.C.

P.S.C. Diagramma di Gandtt

data Giugno 2020

scala

Il Dirigente dell'Area Tecnica  
(ing. Antonio Sorce)

Il Rettore  
(prof. Fabrizio Micari)

S.04

# ALLEGATO "A"

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO**  
**AREA TECNICA**

## DIAGRAMMA DI GANTT

### Cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** Lavori di Ristrutturazione e Adeguamento impiantistico dell'Aula "Maneschi", sita nel plesso di Ostetricia e Ginecologia della Scuola di Medicina e Chirurgia.

**COMMITTENTE:** Università degli studi di Palermo

**CANTIERE:** Via A. Giordano, 9, Palermo (PA)

Palermo, 15/05/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA  
(architetto Musso Rosario)

---

Nome attività	Durata	Settimana 1		Settimana 2				Settimana 3				Settimana 4				Settimana 5				Settimana 6				Settimana 7				Settimana 8				Settimana 9																																				
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59						
<b>ACCANTIERAMENTO</b>	7 g	▲																																																																		
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g	Z1	3																																																																	
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	3 g						Z1	3																																																												
Realizzazione della viabilità del cantiere	1 g									Z1	1																																																									
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g								Z1	1																																																										
<b>LAVORI - FASE UNICA</b>	90 g	▲																																																																		
Dismissione ed allontanamento arredo	2 g												Z1	2																																																						
Rimozione di impianti	5 g														Z1	3																																														Z1	2					
Rimozione di serramenti esterni	2 g													Z1	2																																																					
Posa di serramenti esterni	3 g														Z1	3																																																				
Rimozione di pavimenti interni	4 g																			Z1	4																																															
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	9 g																						Z1	5																																												
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	10 g																																Z1	10																																		
Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	2 g																																															Z1	2																			
Realizzazione di rifacimento servizio igienico ed impianto idrico-sanitario e de	7 g																					Z1	7																																													
Realizzazione di impianto elettrico interno	25 g																																									Z1	20																									
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianti speciali (audio,	12 g																																																																			
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata	10 g																																																																			
Posa macchina di condizionamento	5 g																																																																			
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	6 g																																																																			
Posa di serramenti interni	1 g																																																																			
Formazione di massetto per pavimenti interni	10 g																																																																			
Posa di pavimenti per interni	12 g																																																																			
Posa di rivestimenti interni	8 g																																																																			
Tinteggiatura di superfici interne	1 g																																																																			
<b>SMOBILIZZO CANTIERE</b>	2 g																																																																			
Smobilizzo del cantiere	2 g																																																																			
<b>LEGENDA Zona:</b>																																																																				
Z1 = ZONA UNICA																																																																				
Z2 = Nuova Zona...																																																																				

