UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

Area Edilizia, Servizio Tecnico e Sostenibilità

INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO PRESSO GLI EDIFICI 7 E 8 DI PARCO D'ORLEANS

IL RETTORE: Prof. Massimo Midiri

IL DIRIGENTE: Ing. Antonino Sorce

RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO: Ing. Antonino Sorce

Firmato digitalmente da: Antonio Sorce
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Data: 13/03/2025 16:09:35

I PROGETTISTI:

Dario La Torre
13.01.2025
13:17:31
GMT+00:00

Ing. Dario La Torre ______________

Ing. Luca Portera ______________

TAVOLA **B.9**

SCALA \\\\\\\\\\\\\\\\\\

DATA 12 / 2024

DESCRIZIONE ELABORATO

PROGETTO DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - CRONOPROGRAMMA

COD	CATEGORIA LAVORAZIONE	SOTTO LAVORAZIONE
A	INTERVENTI DI DEMOLIZIONI/RIMOZIONI	DEMOLIZIONI EDILI
		DISMISSIONI/RIMOZIONE SERRAMENTI E INFISSI
		DISMISSIONE MOBILIO
B	INTERVENTI DI NUOVE REALIZZAZIONI	REALIZZAZIONE MURATURE
		REALIZZAZIONE TAMPONAMENTI DI INFISSI
		INTONACI
		CONTROSOFFITTI
		INSTALLAZIONE PORTE REI
		INSTALLAZIONE PORTE
		TRATTAMENTO SUP. LIGNEE
		FORNITURA MOBILIO
C	IMPIANTI TECNOLOGICI: IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO	MANUTENZIONE GRUPPO POMPE
		REALIZZAZIONE DI AMPLIAMENTO RETE
		ADEGUAMENTO ARCHIVIO
D	IMP. TEC.: IMP. DI ILLUMINAZIONE	REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO IMP. DI ILLUMINAZIONE
E	IMP. TEC.: IMP.DI RILEVAZIONE E ALLARME INCENDIO	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ALLARME INCENDIO
S	OPERE PROVVISIONALI E APPRESTAMENTI DI SICUREZZA	OPERAZIONI DI INCANTIERAMENTO
		PONTEGGI / TRABATTELLI
		FORNITURA D.P.I.
		DISMISSIONE CANTIERE

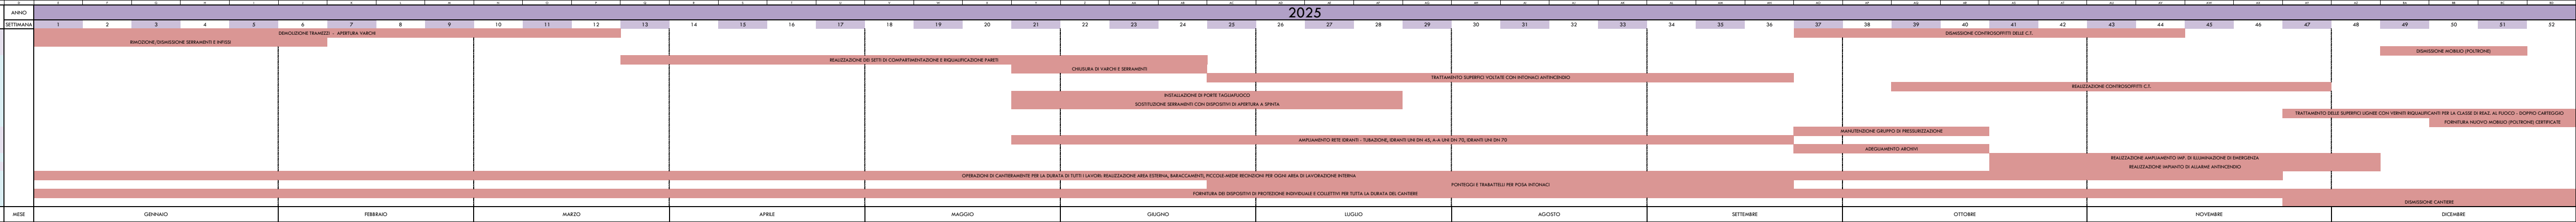
ANNO
2025
SETTIMANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
DEMOLIZIONE TRAMEZZI - APERTURA VARCHI
DISMISSIONE CONTROSOFFITTI DELLE C.T.
RIMOZIONE/DISMISSIONE SERRAMENTI E INFISSI
DISMISSIONE MOBILIO (POLTRONE)
REALIZZAZIONE DEI SETTI DI COMPARTIMENTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PARETI
CHIUSURA DI VARCHI E SERRAMENTI
TRATTAMENTO SUPERFICI VOLTATE CON INTONACI ANTINCENDIO
REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTI C.T.
INSTALLAZIONE DI PORTE TAGLIAFUOCO
SOSTITUZIONE SERRAMENTI CON DISPOSITIVI DI APERTURA A SPINTA
TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI LIGNEE CON VERNITI RIQUALIFICANTI PER LA CLASSE DI REAZ. AL FUOCO - DOPPIO CARTEGGIO
FORNITURA NUOVO MOBILIO (POLTRONE) CERTIFICATE
MANUTENZIONE GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE
AMPLIAMENTO RETE IDRANTI - TUBAZIONE, IDRANTI UNI DN 45, A-A UNI DN 70, IDRANTI UNI DN 70
ADEGUAMENTO ARCHIVI
REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO IMP. DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ALLARME ANTINCENDIO
OPERAZIONI DI CANTIERAMENTE PER LA DURATA DI TUTTI I LAVORI: REALIZZAZIONE AREA ESTERNA, BARACCAMENTI, PICCOLE-MEDIE RECINZIONI PER OGNI AREA DI LAVORAZIONE INTERNA
PONTEGGI E TRABATTELLI PER POSA INTONACI
FORNITURA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVI PER TUTTA LA DURATA DEL CANTIERE
DISMISSIONE CANTIERE
MESE
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
